

Качество данных

В ходе анализа были выявлены отдельные проблемы качества данных, способные влиять на корректность управления отчетности

Для проведения дальнейшего анализа был подготовлен очищенный набор данных

Основные выявленные дефекты

Принятые меры

Пропуски идентификаторов проектов (СПП проекта)	Оставлены только уникальные ненулевые СПП
Технические даты вида 01.01.1900, используемые в качестве маркера отсутствия значения	Технические даты преобразованы в NULL
Смешанный формат дат	Столбцы с датами приведены к формату данных datetime
Несогласованность справочника статусов проектов («В архиве» и «В архив»)	Выполнена нормализация справочника статусов
Пропуски в отдельных аналитических атрибутах	Для атрибута Функциональное направление произведена замена на «Не заполнено»
Повторяющиеся значения идентификаторов проектов, требующие дополнительной бизнес-проверки	Сформирован отдельный файл с данными для проверки

Ключевые выводы и рекомендации

Три главных вывода

01 Бюджетный кризис: прогнозный бюджет портфеля превышает утвержденный почти вдвое (+82,9%)

Особое внимание – Проектный офис 4 с перерасходом +247%

→ **Необходим срочный аудит крупнейших проектов офиса**

02 Системные задержки: каждый второй проект с известными сроками имеет задержку пуска, в среднем на 407 дней

→ **Методология планирования сроков требует пересмотра на уровне всей компании**

03 Перегрузка менеджеров: 29 МП на 1 595 проектов – в среднем 55 проектов на человека. При таком соотношении управление портфелем может носить формальный характер

Три рекомендации

01 Провести ревизию Проектного офиса 4: выяснить причины троекратного превышения бюджета и разработать план по его оптимизации

02 Ввести обязательное заполнение прогнозной даты пуска для всех активных проектов – сейчас 41% портфеля не имеет этих данных

03 Пересмотреть нормативы нагрузки на МП: установить максимальный порог и перераспределить портфель

Ограничения анализа

Настоящий анализ выполнен на основе статистического среза данных

Для более глубоких выводов необходимы дополнительные данные:

01 История изменений бюджета: чтобы понять, на каком этапе происходит основной рост стоимости проекта

02 Причины приостановки: 357 замороженных проектов невозможно сегментировать по типу риска без соответствующего поля в данных


03 Фактические даты начала проектов: для расчета полного цикла реализации и метрики SPI (Schedule Performance Index) / CPI (Cost Performance Index)

04 Расшифровка статуса «В архиве»: неясно, это успешно завершенные или закрытые без результата проекты


Общая картина

Портфель насчитывает **1 586 проектов** после очистки данных с общим утвержденным бюджетом **676,7 млрд руб.**

Распределение проектов по программам и категориям



Утвержденный бюджет (млрд руб.)



01

Компания направляет большую часть инвестиций на поддержание текущих мощностей, а не на стратегическое развитие.

Основная часть портфеля сосредоточена в программе «Поддержание» – **1 343 проекта**

02

По категориям подавляющее большинство проектов относится к категории **С** – **88%**, что типично для операционных портфелей с высокой долей мелких и средних проектов

03

Из 1 586 проектов **828** находятся в активной стадии «В работе» (52%).

⚠ Лишь **1 проект** имеет статус «Завершен» – это аномально мало и требует уточнения логики статусов у владельца данных

Бюджетное исполнение

01 ▲ Совокупный прогнозный бюджет составляет **1 238,0 млрд руб.**, что превышает утвержденный на **561,3 млрд руб. (+82,9%)**

Вывод: реальная стоимость реализации портфеля почти **в 2 раза выше** запланированной

02 502 из 1 229 проектов с ненулевым бюджетом (**40,8%**) имеют прогнозное превышение более 20%

Наиболее критичная ситуация – в **Проектном офисе 4**: превышение достигает **+247,2%**

Гипотеза: столь значительное превышение по офису 4 может объясняться несколькими причинами: наличием нескольких крупных инфраструктурных проектов с существенным пересмотром стоимости, ошибками первоначального планирования или изменением проектного содержания

→ **Рекомендуется провести детальный аудит топ-10 проектов этого офиса по абсолютному размеру перерасхода**

Утвержденный vs Прогнозный бюджет (млрд руб.)



Сроки реализации

01 **▲** Из 766 проектов с датами **каждый второй проект не укладывается в плановые сроки** (393; 51%)

Средняя задержка составляет **407 дней (~1,1 года)**, медианная – **173 дня (~6 месяцев)**

Максимальная зафиксированная задержка составляет **2 832 дня (~1,1 года)**

Задержки равномерно распределены между офисами → **системная проблема планирования**


02 На ближайший горизонт запланировано **163 пуска в 2026 году и 108 пусков в 2027 году**

Гипотеза: системный характер задержек свидетельствует о том, что плановые даты пуска изначально устанавливаются без учета реалистичного буфера на риски

→ **Рекомендуется провести детальный аудит топ-10 проектов с максимальными задержками для извлечения уроков**


Анализ сроков проводился по **766 проектам** (48% портфеля), для которых заполнены обе даты – плановая и прогнозная

Прогноз пусков по годам

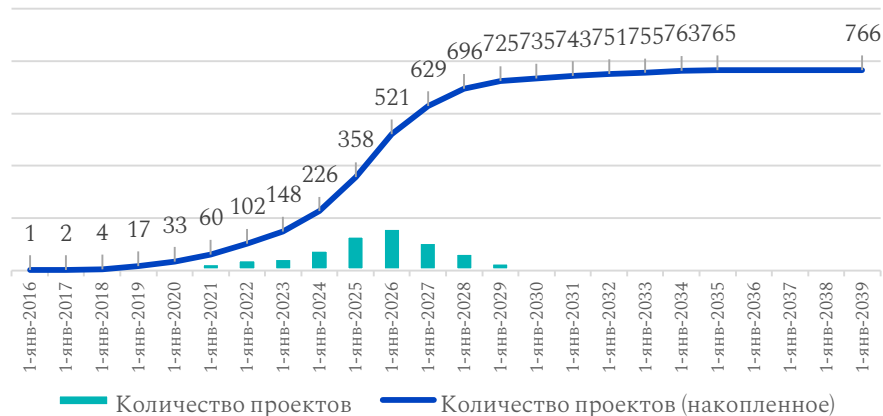

Нагрузка на менеджеров

Топ-10 менеджеров проекта по количеству проектов

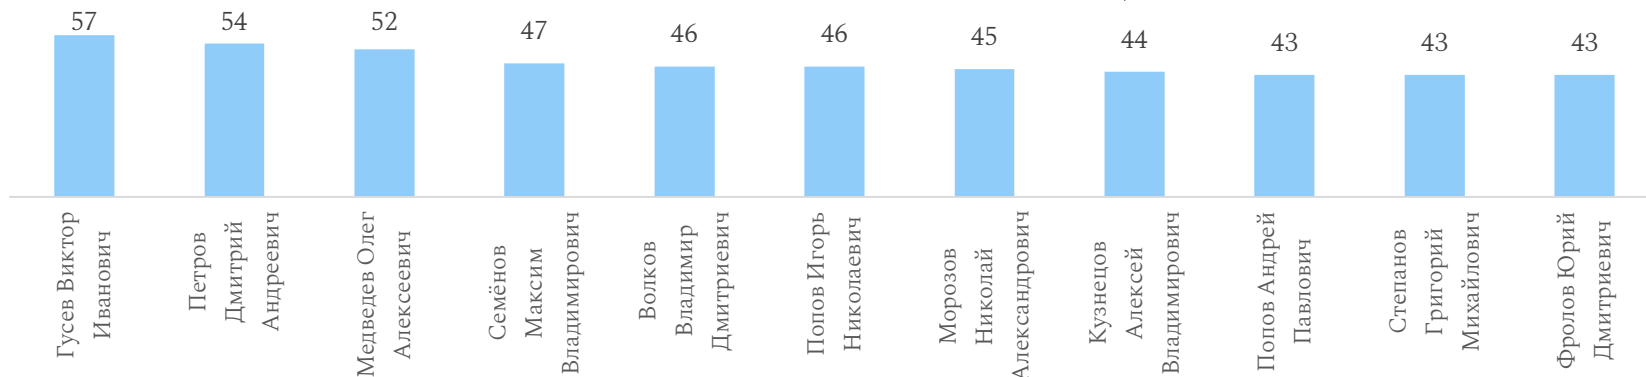

Портфель управляется **29 менеджерами проектов**
В расчет нагрузки включены только активные проекты («В работе», «Приостановлен» и «Не начат»)

01

Среднее количество проектов на одного менеджера – **41 проект**, максимальное – **57 проектов**

⚠ Такой уровень нагрузки является критически высоким, что напрямую влияет на качество контроля сроков и бюджетов

02

Приостановленные проекты распределены равномерно между офисами

Высокая доля приостановленных проектов (22% портфеля) в совокупности с перегруженностью менеджеров может указывать на нехватку ресурсов для одновременного ведения всех активных проектов
